

BOLETIM DE MONITORAMENTO ARACATI – ANO 2025

Início do monitoramento	Janeiro de 2015
Municípios	Aracati, Cumbe, Morrinhos e Icapuí
Quantidade total de poços do monitoramento	16
Quantidade de poços medidos em 2025	16
Postos Pluviométricos:	PPT - FUNCEME - 2025
Aracati – Posto 12	811,30 mm
Icapuí (Barrinha) – Posto 410	466,00 mm
Aquíferos	Aluvionar, Dunas e Barreiras


EQUIPE TÉCNICA

Gerência de Estudos e Projetos - GEPRO	Ana Lúcia Maia de Souza Davi Martins Pereira José Guilherme Filgueira da Silva Zulene Almada Teixeira
Gerência de Monitoramento - GEMON	Renata Vinhas Cruz
Gerência Regional de Limoeiro do Norte	Hermilson Barros de Freitas Allan Freitas de Almeida Jardson Álvaro Freitas José Rodrigo da Silva Brito Marleuda Thais Gomes

DADOS DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS



ITEM	ID	LOCALIDADE	AQUÍFERO	UTM N	UTM E
1	PT-01	Morrinhos	Aluvionar	9487548	639317
2	PT-02	Morrinhos	Aluvionar	9487636	639225
3	PT-03	Morrinhos	Aluvionar	9487617	639212
4	PT-04	Morrinhos	Aluvionar	9487387	638813
5	PT-07	Morrinhos	Aluvionar	9487153	638828
6	PT-09	Morrinhos	Aluvionar	9487244	638782
7	PT-10	Morrinhos	Aluvionar	9487390	638492
8	PT-11	Morrinhos	Aluvionar	9487510	639272
9	PZ-01	Cumbe	Dunas	9503433	637377
10	PZ-02	Cumbe	Dunas	9503405	637638
11	PZ-03	Cumbe	Dunas	9503552	637479
12	COG/ARA/0066	Aracati	Dunas	9503461	637340
13	COG/ARA/0070	Canoa Quebrada	Barreiras	9499452	644316
14	COG/ARA/0101	Aracati	Barreiras	9493291	641201
15	COG/ARA/0102	Aracati	Barreiras	9493571	641288
16	COG/ICA/0016	Icapuí	Barreiras	9479410	682116

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS MONITORADOS

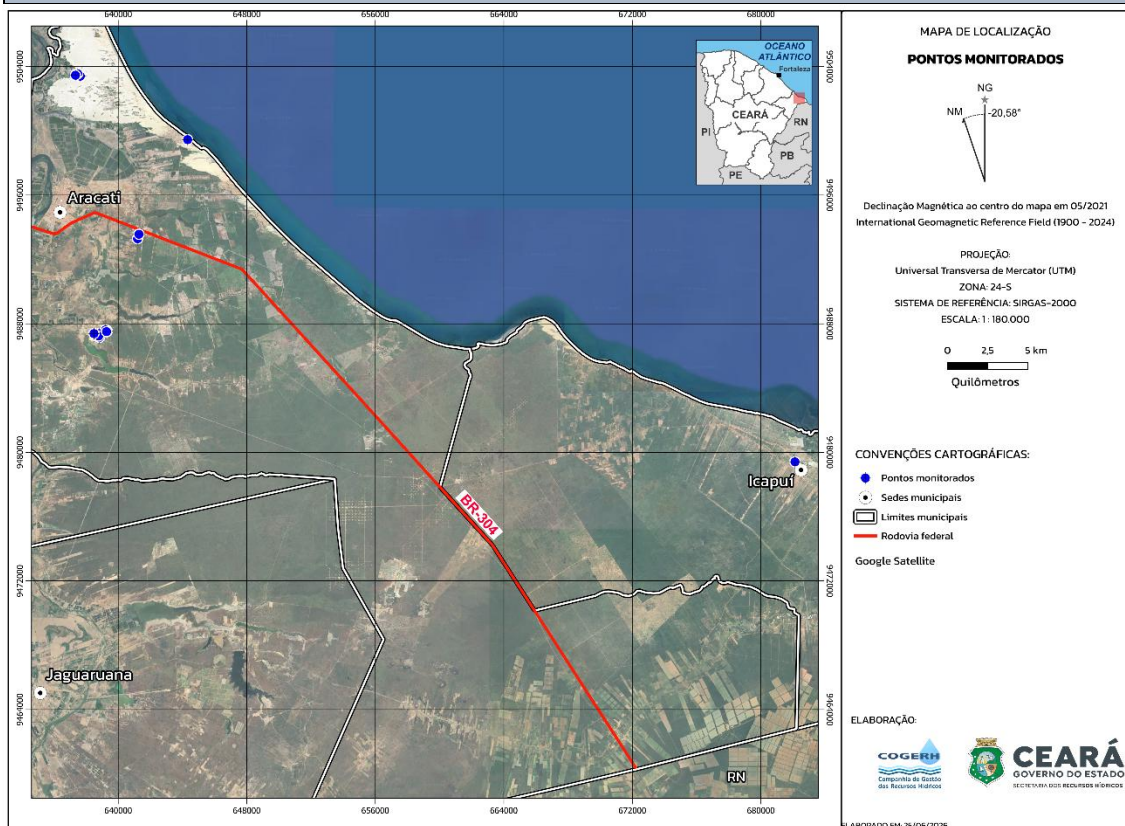

DADOS DO MONITORAMENTO

ITEM	ID	Nível Estático (m)											
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1	PT-01	5,75	5,49	5,29	5,41	5,46	5,54	5,67	5,77	5,95	6,10	6,10	6,59
2	PT-02	3,30	3,30	3,06	3,22	3,21	3,35	3,49	3,59	3,77	3,84	3,97	4,06
3	PT-03	3,34	3,41	3,14	3,27	3,21	3,32	3,54	3,54	3,77	4,05	3,95	4,10
4	PT-04	3,29	3,34	3,19	3,29	3,25	3,64	3,51	3,55	3,81	3,89	3,69	4,55
5	PT-07	4,16	4,02	4,06	4,09	3,72	3,68	3,92	4,05	3,75	3,83	4,56	4,83
6	PT-09	3,66	3,66	3,44	3,59	3,41	3,51	3,75	3,88	3,58	3,66	3,97	4,28
7	PT-10	6,11	6,11	5,83	5,88	5,93	6,02	6,18	6,29	6,37	6,45	6,50	6,55
8	PT-11	6,10	5,52	4,95	5,03	5,11	5,54	5,72	5,44	5,61	6,08	5,74	6,45
9	PZ-01	4,73	4,53	4,07	3,96	4,25	4,13	4,20	4,57	4,53	4,92	4,93	5,97
10	PZ-02	4,74	4,54	4,17	4,02	4,36	4,29	4,34	4,68	4,62	5,03	4,99	5,55
11	PZ-03	4,68	4,42	3,92	3,24	3,31	3,38	4,50	4,47	4,38	4,46	5,20	5,36
12	COG/ARA/0066				4,83	4,77	4,52	4,54	4,56	4,89	5,36	5,60	5,38
13	COG/ARA/0070	23,18	23,11	22,00	22,08	22,16	22,16	22,35	22,50	22,52	22,46	22,61	22,55
14	COG/ARA/0101	30,77	30,82	30,54	30,13	30,13	30,18	30,55	30,74	31,23	31,35	31,54	31,68
15	COG/ARA/0102	23,10	23,16	23,15	23,05	22,32	22,37	22,74	22,93	22,96	23,06	23,12	23,31
16	COG/ICA/0016	2,32	2,34	1,75	1,71	1,91	1,94	1,73	2,43	2,18	2,48	1,83	2,28
PPT Aracati (mm)		170,00	77,00	276,00	142,50	31,00	92,00	15,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,80
PPT Icapuí (mm)		91,00	79,40	210,80	46,60	8,40	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

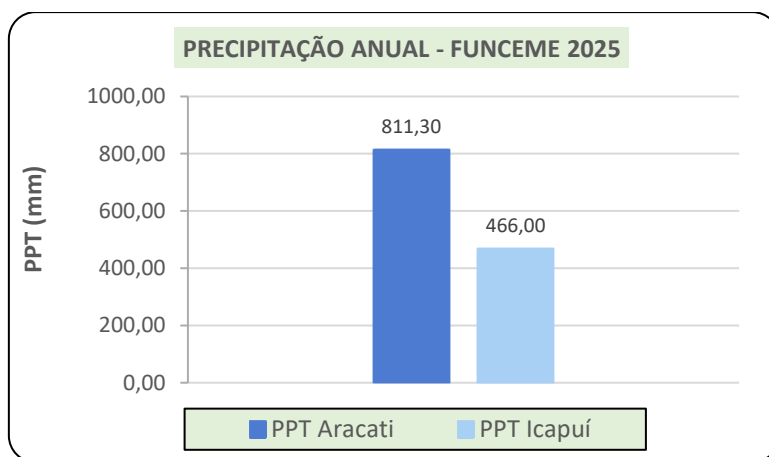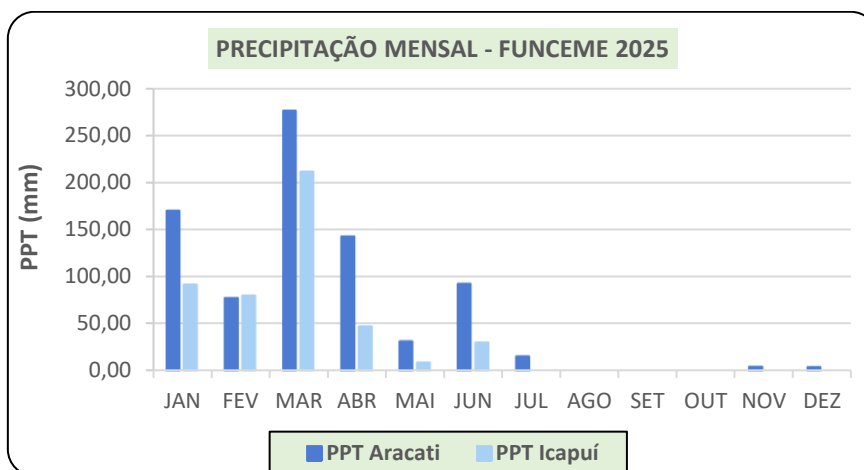

GRÁFICOS DE NÍVEL ESTÁTICO (LINHA) X PRECIPITAÇÃO (COLUNA)

