

BOLETIM DE MONITORAMENTO METROPOLITANAS – ANO 2025

Início do monitoramento	Janeiro de 2015
Municípios	Beberibe, São Gonçalo do Amarante, Aquiraz e Caucaia
Quantidade total de poços do monitoramento	12
Quantidade de poços medidos em 2025	12
Postos Pluviométricos: Beberibe – Posto 23 São Gonçalo do Amarante – Posto 775 Aquiraz – Posto 11 Caucaia – Posto 38	PPT - FUNCEME - 2025 973,00mm 1.706,30 mm 1.957,70 mm 2.038,60 mm
Aquíferos	Dunas e Barreiras



EQUIPE TÉCNICA



Gerência de Estudos e Projetos - GEPRO	Ana Lúcia Maia de Souza Davi Martins Pereira José Guilherme Filgueira da Silva Zulene Almada Teixeira
Gerência de Monitoramento - GEMON	Renata Vinhas Cruz
Gerência Regional das Bacias Metropolitanas	Berthyer Peixoto de Lima Abraão Costa


DADOS DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS

ITEM	ID	LOCALIDADE	AQUÍFERO	UTM N	UTM E
1	BB 1	Lagoa da Uberaba – Beberibe	Barreiras	9536945	601186
2	BB 2	Lagoa da Uberaba – Beberibe	Barreiras	9536884	600702
3	BB 3	Lagoa da Uberaba – Beberibe	Barreiras	9536727	600699
4	BB 4	Lagoa da Uberaba – Beberibe	Barreiras	9536004	601983
5	BB 5	Lagoa da Uberaba – Beberibe	Barreiras	9536275	600699
6	PC 1	Lagoa do Pecém – São Gonçalo	Dunas	9606977	519478
7	PC 2	Lagoa do Pecém – São Gonçalo	Dunas	9606757	519493
8	CB 1	Lagoa das Cobras – São Gonçalo	Dunas	9609946	511110
9	AQ2	Lagoa do Catu - Aquiraz	Barreiras	9566018	572196
10	AQ3	Lagoa do Catu - Aquiraz	Barreiras	9566209	572077
11	CC1	Lagoa do Parnamirim - Caucaia	Dunas	9596836	531600
12	CC2	Lagoa do Parnamirim - Caucaia	Dunas	9596951	531519

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS MONITORADOS

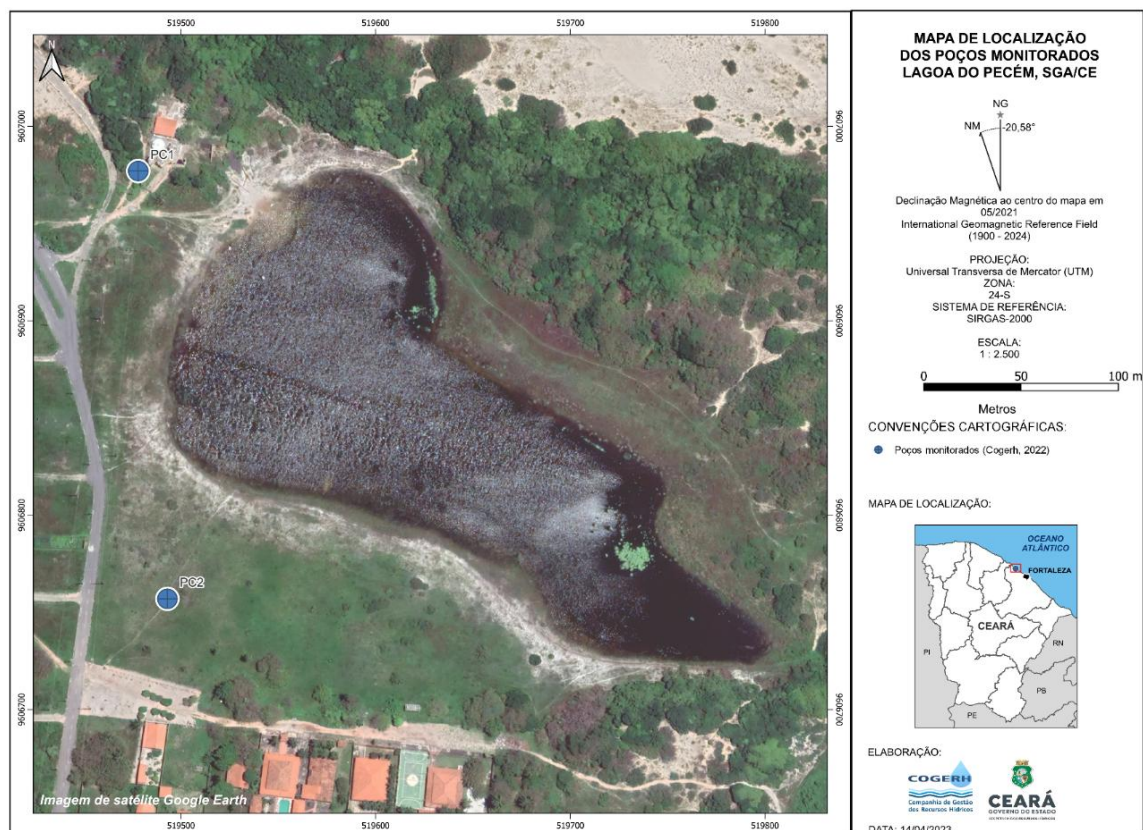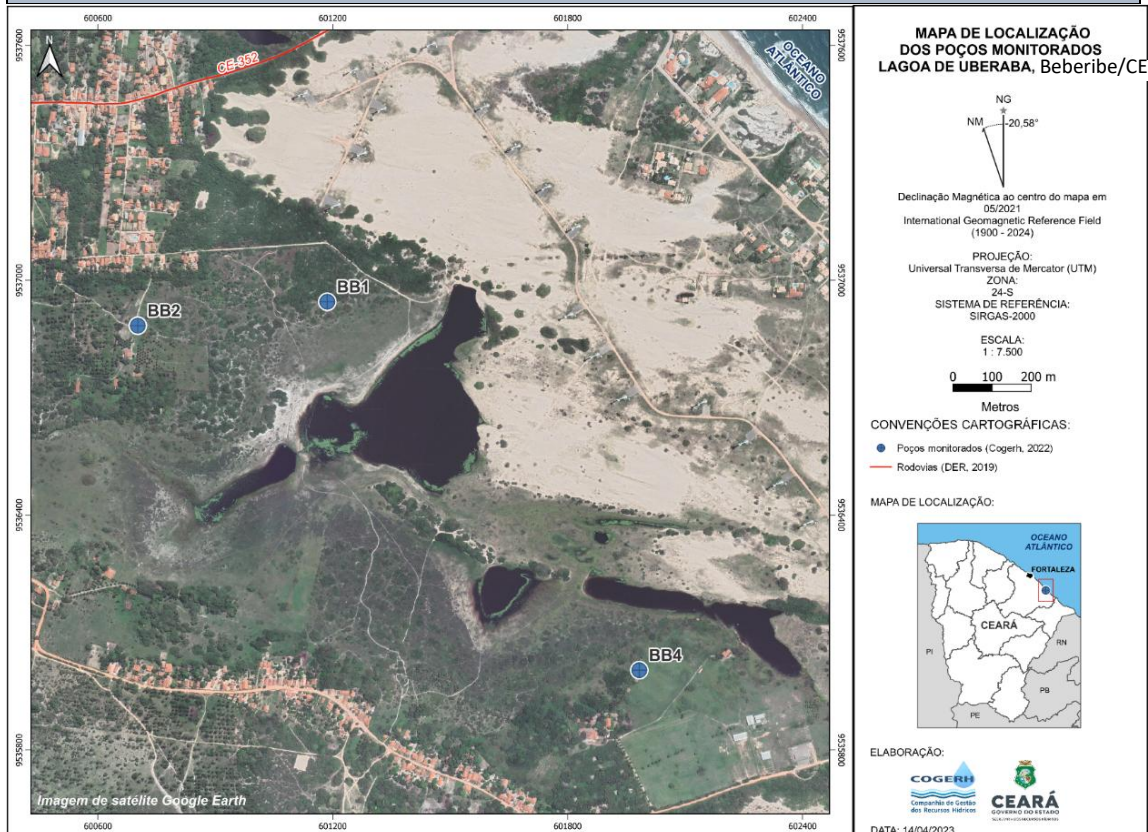


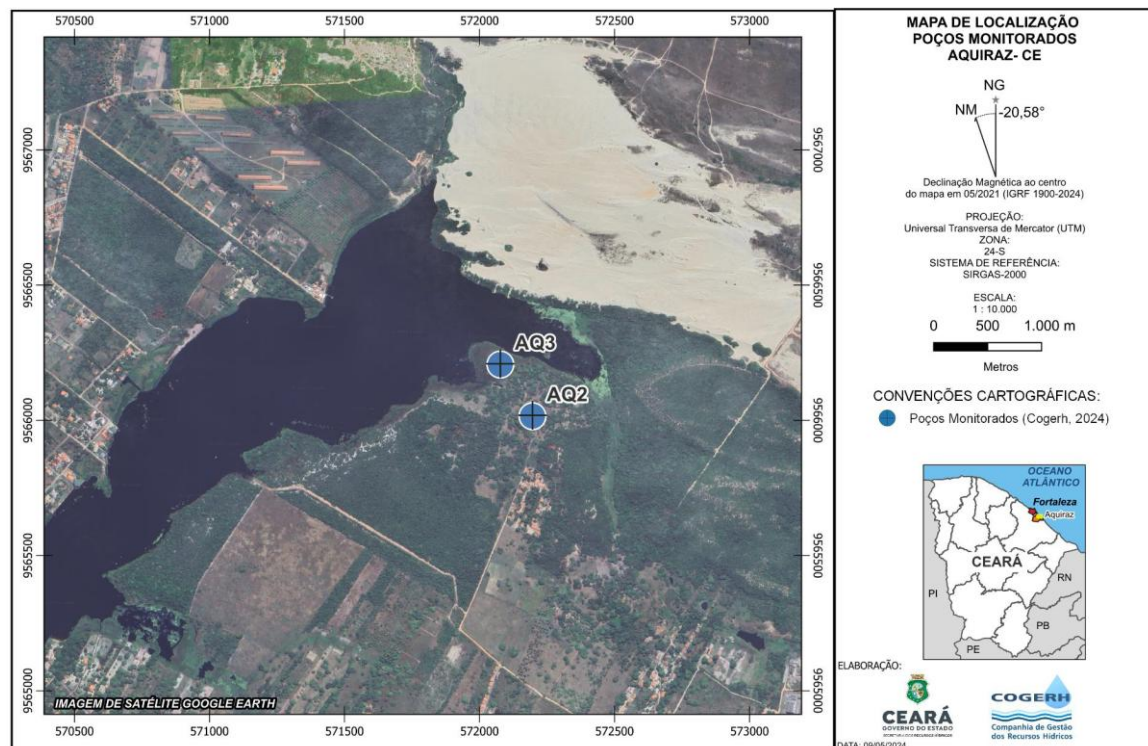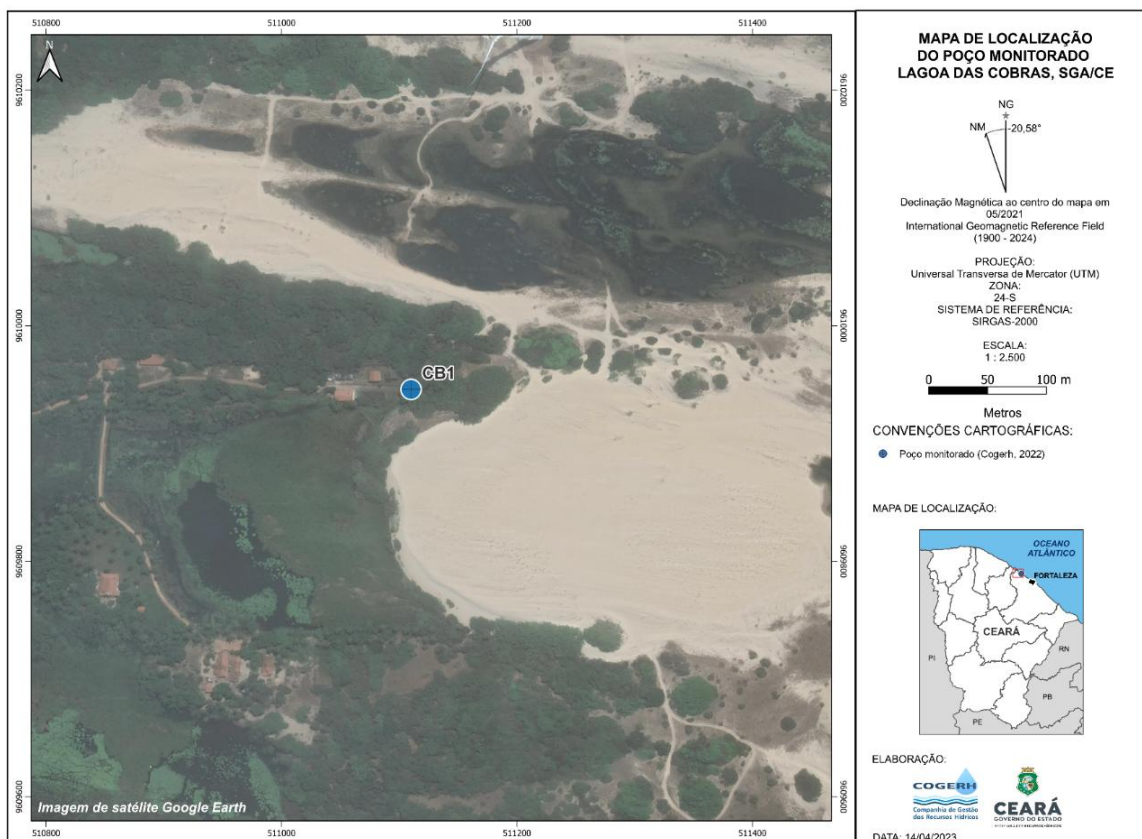

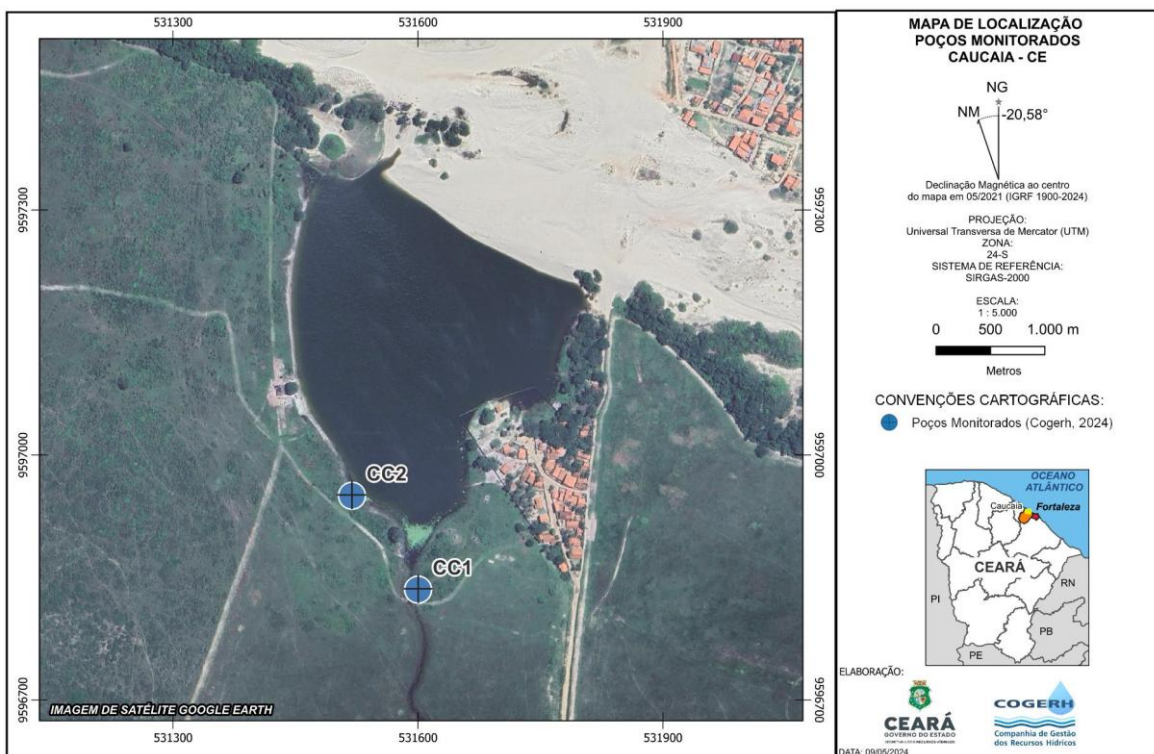


DADOS DO MONITORAMENTO													
ITEM	ID	Nível Estático (m)											
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1	BB 1	5,03	5,02	5,19	4,32	4,59	4,74	4,89	4,85	5,33	5,61	5,81	5,99
2	BB 2	5,92	6,04	5,95	4,96	5,20	5,39	5,57	5,55	5,97	6,23	6,41	6,61
3	BB 3	4,96	4,91	4,76	3,83	4,16	4,39	4,57	4,78	5,01	5,28	5,28	5,60
4	BB 4	3,44	3,20	2,61	2,40	2,65	2,91	3,10	3,12	3,57	3,81	3,99	4,14
5	BB 5	3,73	3,55	3,29	2,85	3,07	3,29	3,42	3,55	3,86	4,11	4,28	4,44
6	PC 1			4,80	4,51	4,08	4,07	3,85	4,06	4,30	4,63	4,85	
7	PC 2	2,65	2,36	1,82	1,53	1,26	1,12	1,07	1,29	1,50	1,76	1,96	2,19
8	CB 1	4,07	3,78	3,23	3,18	3,12	3,14	3,17	3,26	3,36	3,54	3,67	3,84
9	AQ2			5,22	3,88	4,27	4,61	4,92	5,01	5,30			
10	AQ3	2,07	1,45	0,66	0,80	0,85	0,90	0,88	0,77	1,17	1,44	1,66	1,88
11	CC1	2,27	1,95	1,66	1,07						1,40	1,67	2,01
12	CC2	1,71	1,69	0,86									1,25
PPT Posto 23 (mm)		71,0	312,0	330,0	411,0	297,0	113,0	4,0	0,0	0,0	2,0	0,0	64,0
PPT Posto 775 (mm)		24,7	590,7	397,2	296,6	274,2	115,8	21,4	0,0	0,0	1,1	1,2	44,5
PPT Posto 11 (mm)		33,2	495,0	442,3	351,5	273,5	126,4	21,0	0,0	1,0	1,3	2,0	36,1
PPT Posto 38 (mm)		48,2	546,0	562,5	365,4	294,2	111,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5

PRECIPITAÇÃO MENSAL (POSTOS FUNCEME - 2025)

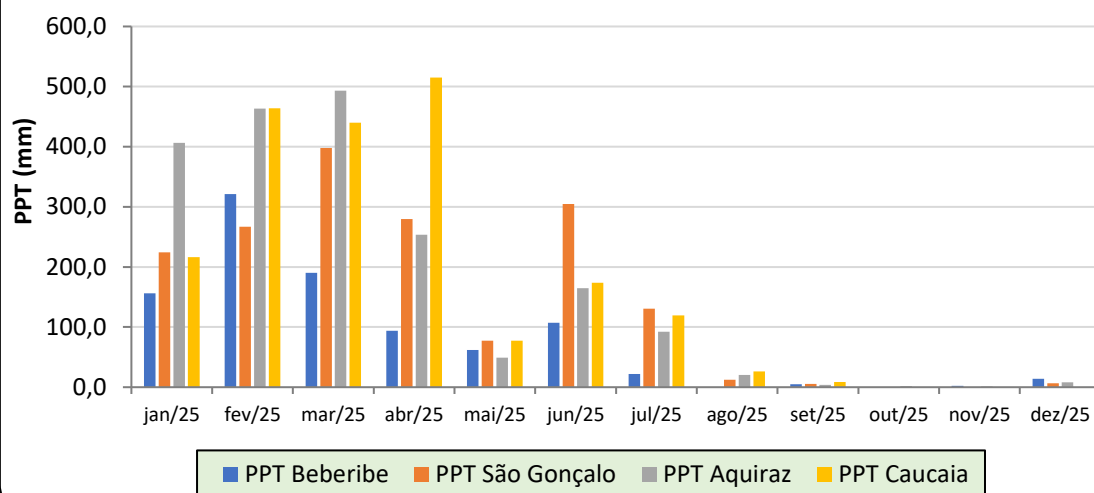

PRECIPITAÇÃO ANUAL (POSTOS FUNCEME - 2025)

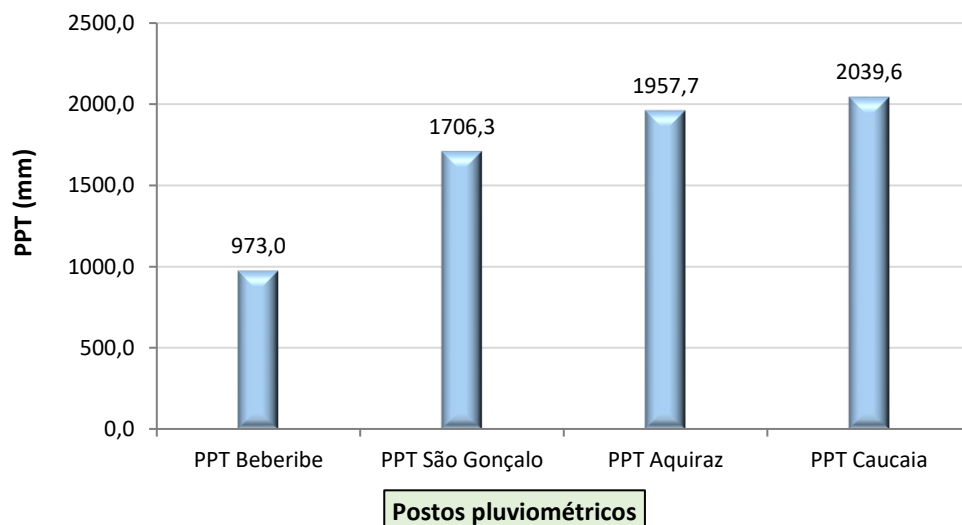

GRÁFICOS DE NÍVEL ESTÁTICO (LINHA) X PRECIPITAÇÃO (COLUNA)

